

Způsoby implementace podnikových informačních systémů (PIS)

Proč je implementace PIS důležitá?

- Implementace = kritický krok životního cyklu PIS
- Vysoké riziko neúspěchu (např. překročení rozpočtu, času, nesplnění cílů)
- Dopady na chod a konkurenceschopnost podniku
- Role IT specialisty v tomto procesu

Fáze 0: Příprava – Klíčové Předpoklady

- Jasně cíle a rozsah (Scope)
- Vybraný systém a dodavatel
- Schválený rozpočet a harmonogram
- Sestavený implementační tým
- Podpora vrcholového managementu (!!!)


Fáze 0: Příprava – Klíčové Aktivity

- Analýza a (re)design podnikových procesů (BPR)
- Příprava dat pro migraci (analýza kvality, plán čištění)
- Detailní plán implementace

Implementační Strategie – Přehled


- Jak dostat nový systém do provozu?
- Hlavní přístupy:
 - - Velký třesk (Big Bang)
 - - Fázové nasazení (Phased Rollout)
 - - Paralelní provoz (Parallel Run)
 - - Pilotní projekt (Pilot Implementation)

Implementační Strategie – Přehled

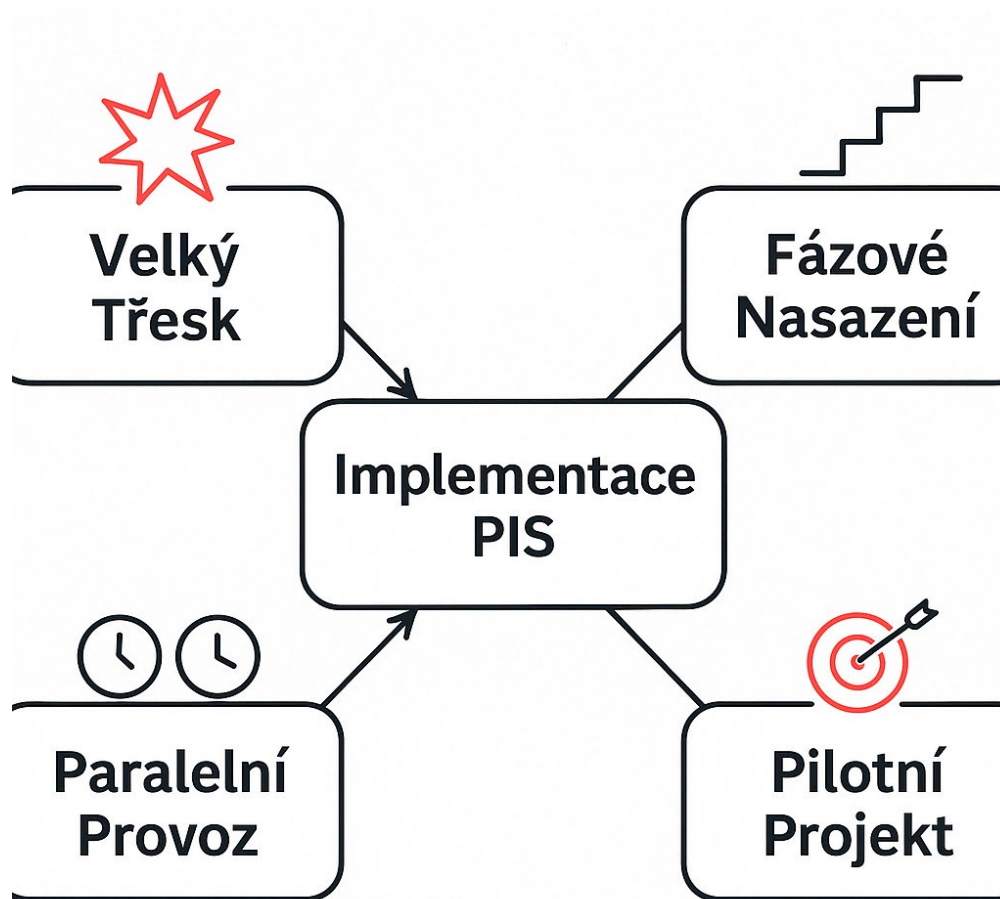

Strategie 1: Velký Třesk (Big Bang)

- Princip: Vše najednou (moduly, uživatelé, lokace). Ostrý řez.
- Kdy: Menší firmy, jednoduché systémy, vysoká tolerance k riziku.

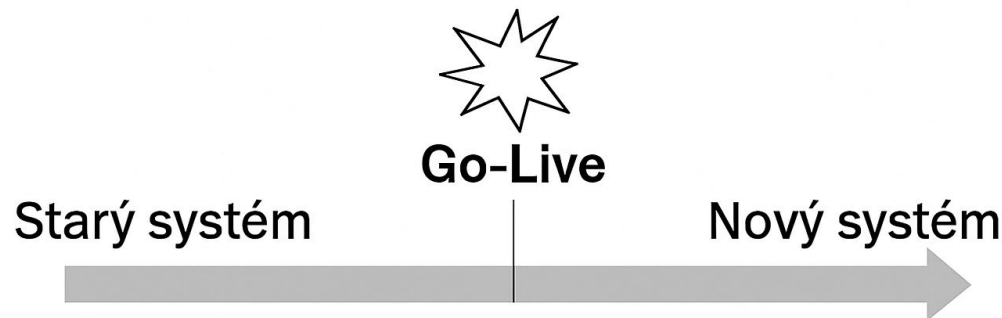


Velký Třesk – Výhody, Nevýhody & Příklad

- Výhody: Rychlost, nižší potřeba dočasných rozhraní, jasný termín.
- Nevýhody: Vysoké riziko, velký tlak, dopad chyb je plošný.
- Příklad: Střední výrobní firma, jeden závod, přechod na nové ERP přes víkend.

Strategie 2: Fázové Nasazení (Phased Rollout)

- Princip: Postupné zavádění (moduly, útvary, lokace).
- Kdy: Komplexní systémy, větší firmy.

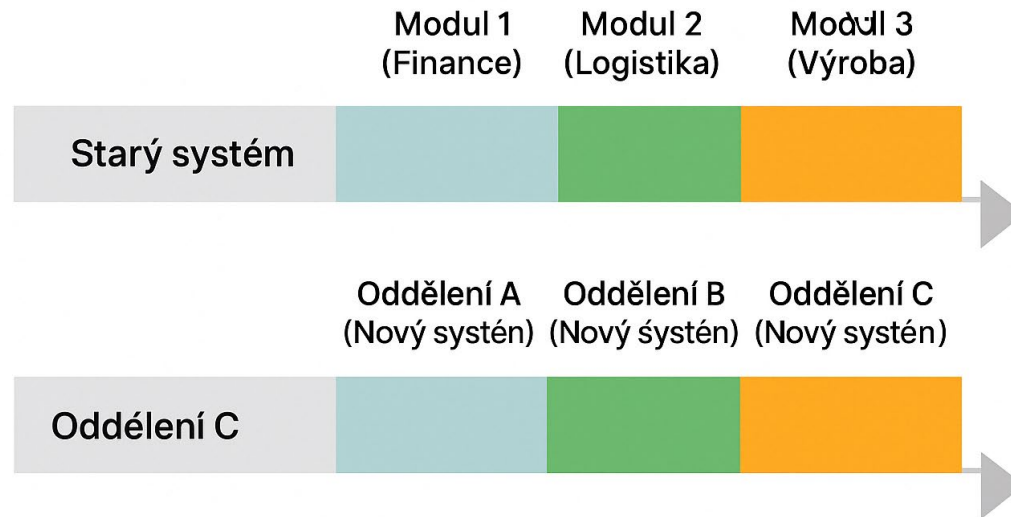


Fázové Nasazení – Výhody, Nevýhody & Příklady

- Výhody: Nižší riziko, učení se z fází, rozložení zátěže.
- Nevýhody: Delší doba, dočasná rozhraní, riziko únavy z projektu.
- Příklad: Modulární: Finance -> Logistika -> Výroba; Organizační: CRM v ČR -> CRM v DE -> CRM v PL.

Strategie 3: Paralelní Provoz (Parallel Run)

- Princip: Starý i nový systém běží současně.
- Kdy: Kritické systémy (banky, nemocnice).

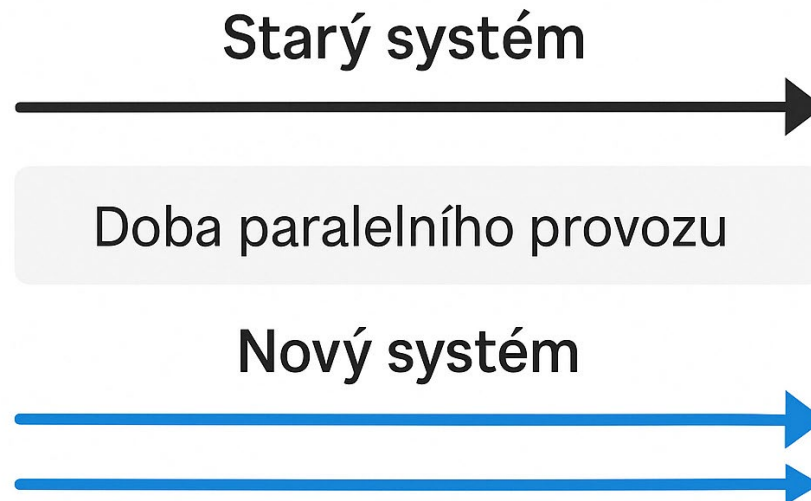


Paralelní Provoz – Výhody, Nevýhody & Příklad

- Výhody: Nejnižší riziko přerušení, možnost ověření.
- Nevýhody: Extrémně nákladné, náročné na uživatele.
- Příklad: Banka – souběžný provoz starého a nového core systému 1 měsíc.

Strategie 4: Pilotní Projekt (Pilot Implementation)

- Princip: Plné nasazení systému v omezené části organizace.
- Kdy: Velké organizace, testování konceptu.

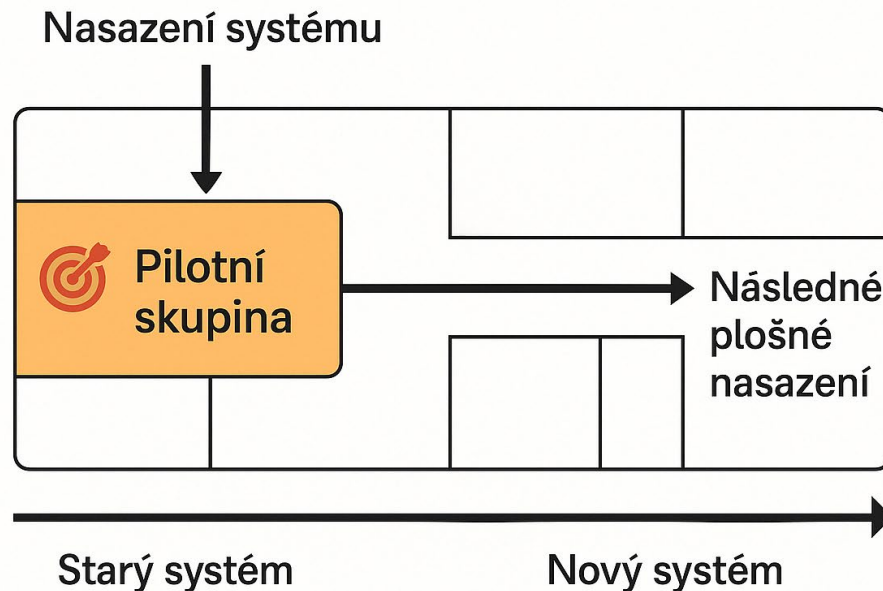

Pilotní Projekt – Výhody, Nevýhody & Příklad

- Výhody: Ověření v reálu, nízké riziko, zpětná vazba.
- Nevýhody: Pilot nemusí být reprezentativní, prodloužení celkové doby.
- Příklad: Retailový řetězec testuje nový POS systém v jedné prodejně.

Shrnutí Strategií & Faktory Volby

- Neexistuje 'nejlepší' strategie.
- Co ovlivňuje výběr:
 - - Tolerance k riziku
 - - Velikost a komplexita firmy
 - - Komplexita systému
 - - Dostupné zdroje
 - - Firemní kultura

Klíčové Aktivity & Faktory Úspěchu – Přehled

- Implementace není jen o technologii!
- - Řízení změn
- - Migrace dat
- - Testování
- - Školení uživatelů
- - Projektové řízení
- - Technická infrastruktura

Faktor 1: Řízení Změn

- LIDÉ jsou klíčoví!
- Komunikace (Proč? Co? Kdy? Jaký dopad?)
- Zapojení uživatelů (Klíčové uživatelé, šampioni)
- Řešení odporu (Školení, podpora)
- Příklad: Newslettery, workshopy, dedikovaná podpora.

Faktor 2: Migrace Dat

- "Garbage in, garbage out."
- Proces: Extrakce -> Čištění -> Transformace -> Nahrání (ETL)
- Výzvy: Kvalita dat, objem, formáty, duplicity.
- Příklad: Čištění databáze zákazníků před migrací.
- Role IT: ETL nástroje, validace dat.

Faktor 3: Testování

- Cíl: Ověřit, že systém funguje dle požadavků.
- Typy: Jednotkové, Integrační, Systémové, Výkonnostní, UAT.
- UAT – potvrzení uživateli.
- Příklad: Účetní testují měsíční závěrku.
- Role IT: Testovací scénáře, automatizace.

Faktor 4: Školení Uživatelů

- Cíl: Naučit efektivně pracovat se systémem.
- Formy: Prezenční, E-learning, Manuály, Train the trainer.
- Přizpůsobení rolím.
- Příklad: Skladník (skener), Manažer (reporty).

Faktor 5: Projektové Řízení & Metodiky

- Magický trojúhelník: Rozsah - Čas - Náklady (+ Kvalita).
- Řízení rizik.
- Metodiky: Waterfall, Agile (SCRUM).
- Role IT: Projektový manažer, analytici, SCRUM master...

Faktor 6: Technická Infrastruktura

- Zajištění HW, SW, sítí, bezpečnosti.
- On-Premise vs. Cloud (IaaS, PaaS, SaaS).
- Role IT: Správci systémů, síťoví specialisté, bezpečnostní experti.

Fáze po Implementaci (Go-Live & Dále)

- Go-Live Support (Hypercare): Intenzivní podpora po spuštění.
- Vyhodnocení projektu: Splnění cílů? ROI? Lessons Learned.
- Stabilizace a optimalizace: Doladění výkonu, procesů.
- Běžný provoz a údržba: Aktualizace, podpora.
- Další rozvoj: Nové moduly, funkce, integrace.

Shrnutí & Klíčové Závěry

- Výběr strategie závisí na kontextu.
- Úspěch není jen o technologii – klíčové jsou procesy, lidé a řízení změn.
- Pečlivá příprava, testování a školení jsou nezbytné.
- Implementace = komplexní projekt s multidisciplinárním týmem.
